

令和8年8月末現在建設工事進捗状況


工 事 名 称	(仮称) 名寄地区一般廃棄物中間処理施設建設工事
工 事 場 所	北海道名寄市字大橋140番地1及び146番地11
敷 地 面 積	13,742.56 m ²
構 造 及 び 規 模	鉄骨造、一部RC・SRC造、地上5階建
建築面積/延床面積	2,705.43 m ² / 5,012.34 m ²
契 約 工 期	令和5年9月25日 から 令和9年3月12日 まで

【今月の主な作業】

- ・ LGS組立、ビニルクロス張り、監視室他OAフロア施工、エントランス玄関・階段補修、床補修
- ・ 建築電気各所器具取付、建築機械配管・ダクト取付、配管・配線敷設、器具・盤取付、配線・結線（破碎選別）
- ・ プラント用水受水槽防水施工、助燃油貯留槽耐圧盤型枠組立、助燃油貯留槽耐圧盤コン打設・据付・柱型枠・埋戻し
- ・ ランプウェイ：デッキ配筋、スラブコン打設、腰壁型枠組立、屋根折取付、腰壁上部型枠組立・コン打設、鉄骨塗装、胴縁納め
- ・ 炉・ガス冷却室耐火物施工、ITV・現場操作盤取付、歩廊手摺取付、南・西仮囲い撤去、路盤掘削・整地
- ・ L型擁壁施工、北面凍上抑制層、現場操作盤制御盤据付、工作室床防塵塗装、炉室鉄骨塗装
- ・ 浄化槽：据付、埋戻し、捨コン打設、上部スラブ配筋・型枠組立、シートバイル撤去
- ・ ボード張り、内部足場解体、盛替え、水槽左官補修・床防水、床仕上げ、水槽内エポキシライニング
- ・ 5FL防水保護シート・トップコート、プラント階段室手摺取付、排水工

実施出来高	80.70%	作業人員累計	月計 2,570 人	累計 29,679 人
-------	--------	--------	------------	-------------

工事記録写真（撮影日：令和8年8月31日）

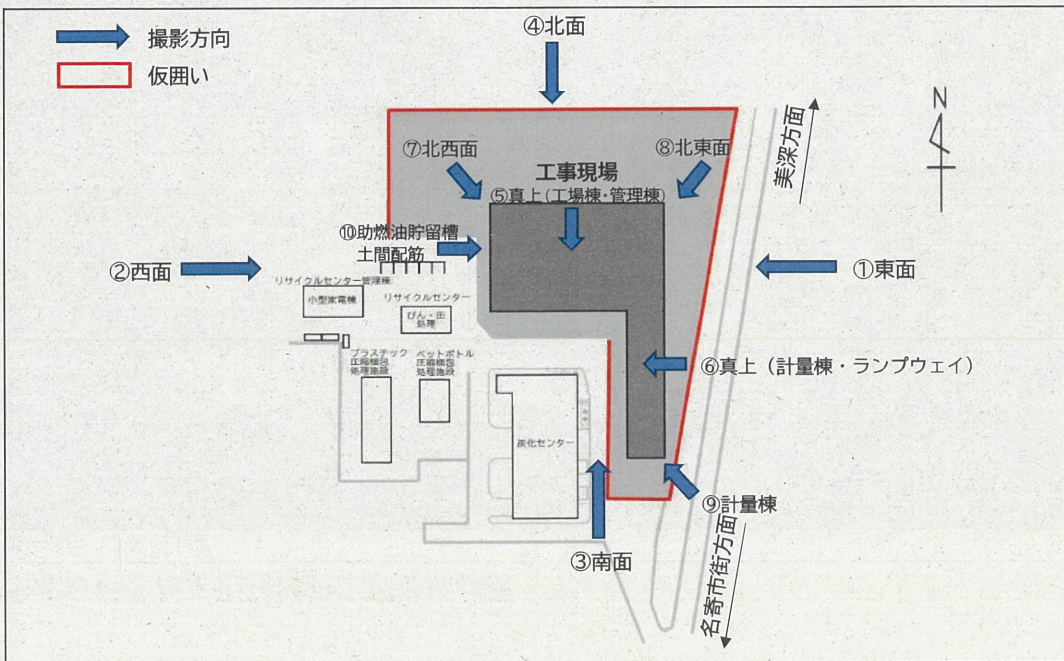

攝影個所：①東面上空



摄影箇所：②西面上空



令和8年8月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：③南面上空



撮影箇所：④北面上空



撮影箇所：⑤真上（工場棟・管理棟）



撮影箇所：⑥真上（計量棟・ランプウェイ）



令和8年8月末現在建設工事進捗状況

撮影箇所：⑦北西面



撮影箇所：⑧北東面



撮影箇所：⑨計量棟



撮影箇所：⑩助燃油貯留槽土間配筋

